4. REZULTAT ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI

Tablica rezultata ispitivanja

Redni broj	ISPITANA DIONICA / OBJEKT	DOPUŠTENI GUBITAK V_{dop} (litara)	IZMJERENI GUBITAK (Vizm) V_{izm} (litara)	REZULTAT ISPITIVANJA zadovoljava / ne zadovoljava
Cjevovod fekalne odvodnje				
1.	RO1	1,06	14,3	ne zadovoljava
2.	RO1 – RO3	3,55	0,0	**zadovoljava**
3.	RO3	1,68	12,4	ne zadovoljava
4.	RO3 – RO6	6,25	2,3	**zadovoljava**
5.	RO6 – RO7	0,71	16,3	ne zadovoljava
6.	RO7 – RO8	1,93	0,0	**zadovoljava**
7.	RO19	0,97	0,0	**zadovoljava**
8.	MASTOLOV – RO17	0,71	0,0	**zadovoljava**
9.	RO16	0,95	9,6	ne zadovoljava
10.	RO16 – RO14	4,65	1,2	**zadovoljava**
11.	RO14 – RO12	3,34	0,0	**zadovoljava**
12.	RO12 – RO9	7,32	2,1	**zadovoljava**
13.	RO9	1,17	11,2	ne zadovoljava
14.	RO9 – RO8	0,89	0,0	**zadovoljava**
Cjevovod zauljene oborinske odvodnje				
15.	SL4	0,61	10,6	ne zadovoljava
16.	SL2	0,58	11,3	ne zadovoljava
17.	SL3 – RO18	8,31	2,3	**zadovoljava**
18.	RO18 – SL1	0,52	0,0	**zadovoljava**


*oznake dionica i objekata preuzete su iz dokumentacije nastale temeljem prikupljenih podataka sa terena

Tablica rezultata ispitivanja

Redni broj	ISPITANA DIONICA / OBJEKT	DOPUŠTENI GUBITAK V_{dop} (litara)	IZMJERENI GUBITAK (Vizm) V_{izm} (litara)	REZULTAT ISPITIVANJA zadovoljava / ne zadovoljava
Cjevovod zauljene oborinske odvodnje				
19.	SL1	0,58	16,3	ne zadovoljava
20.	SL2 – RO18	2,41	0,0	**zadovoljava**
21.	RO18	1,64	14,8	ne zadovoljava
22.	LR1 – UB4	1,84	0,0	


*oznake dionica i objekata


SHEMATSKI PRIKAZ CJEVOVODA ZAULJENE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE DO

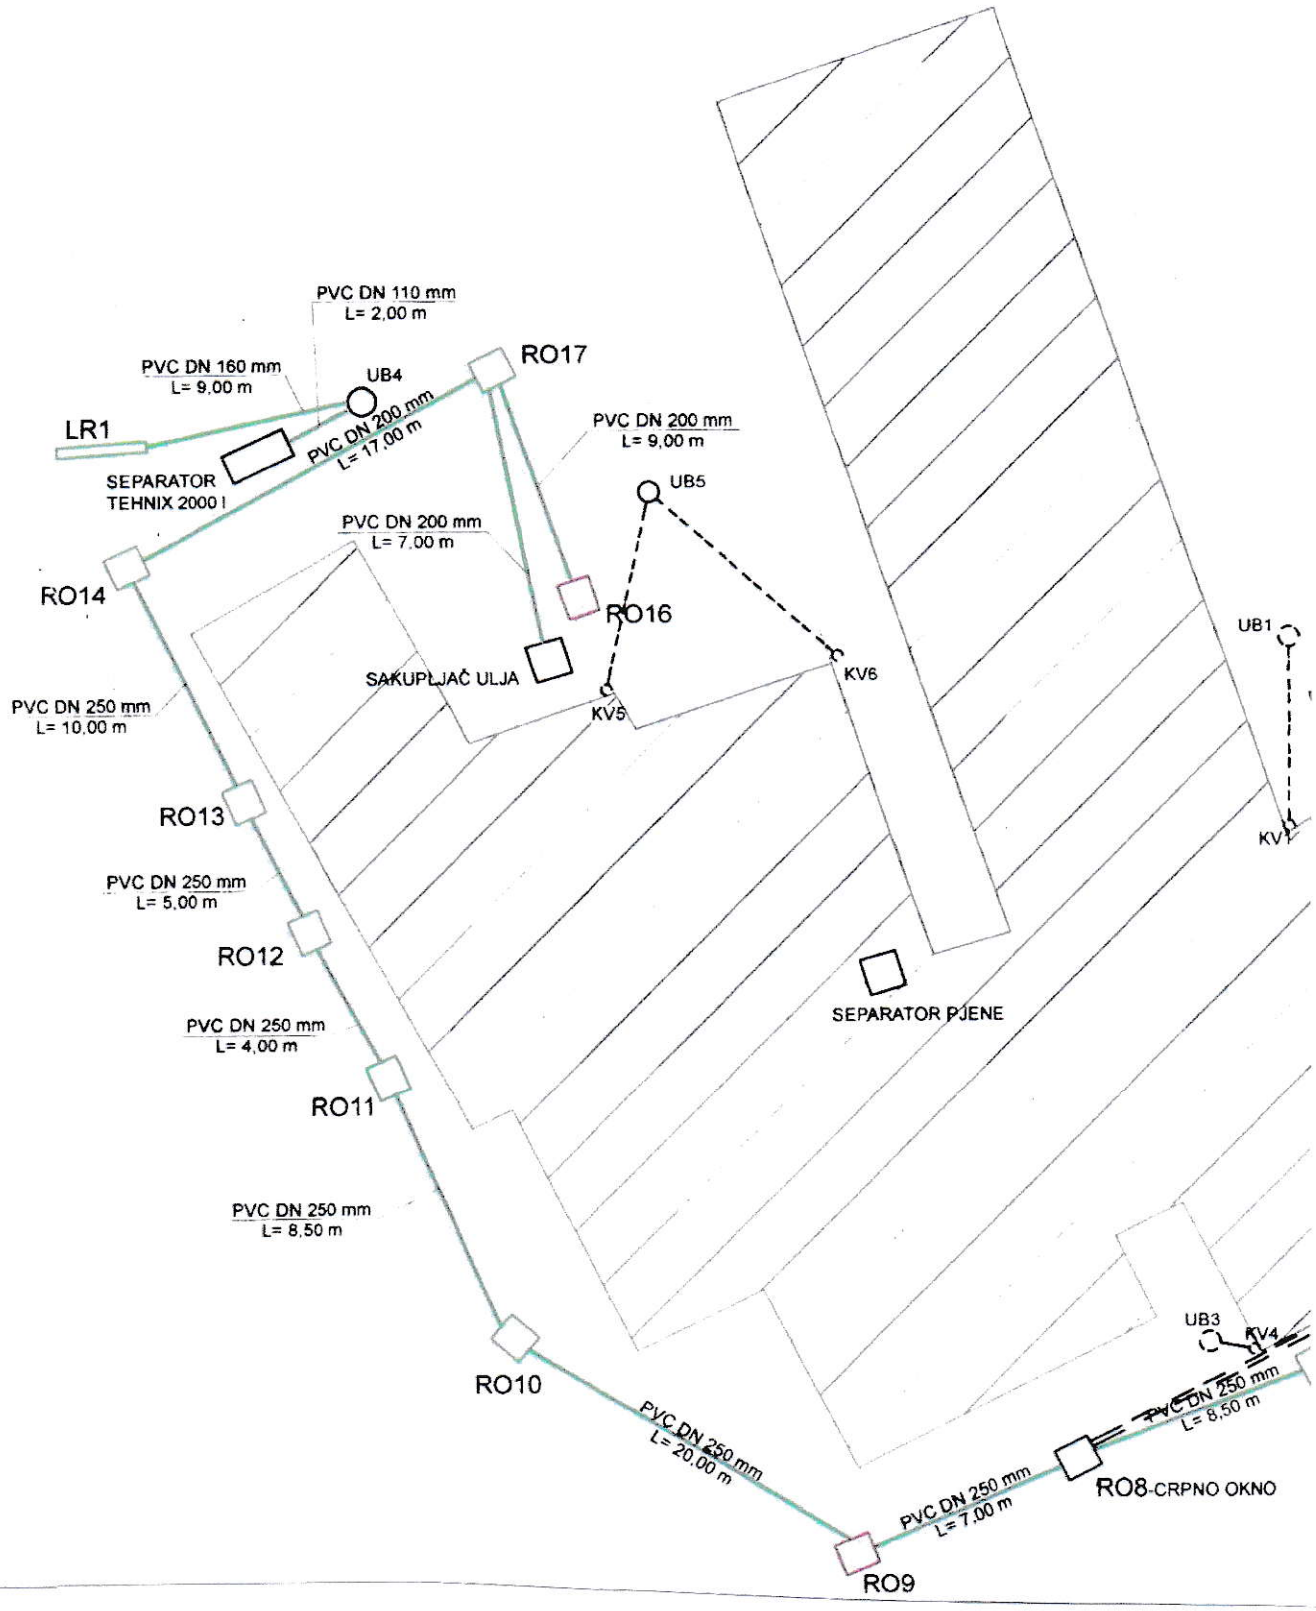

MA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ NA ADRESI PUT KROZ OKLAJ 87/1 U MJESTU OKLAJ POKRAJ KNINA



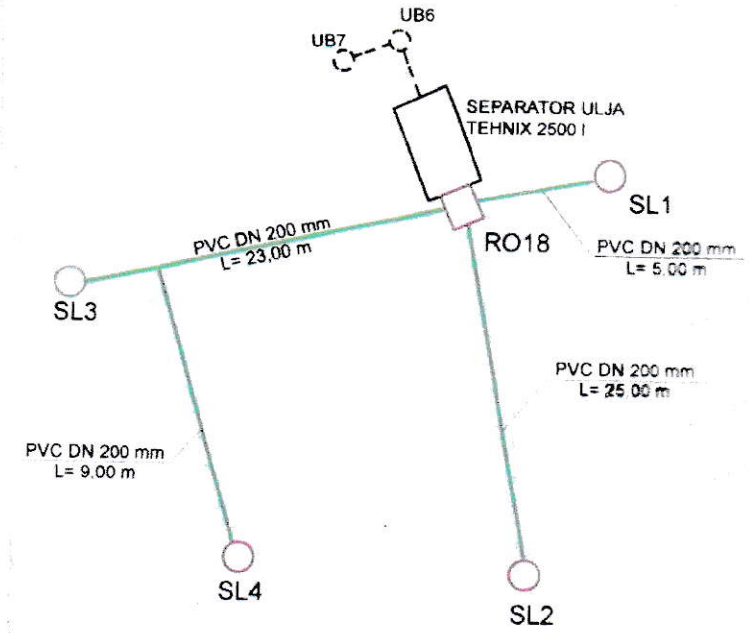

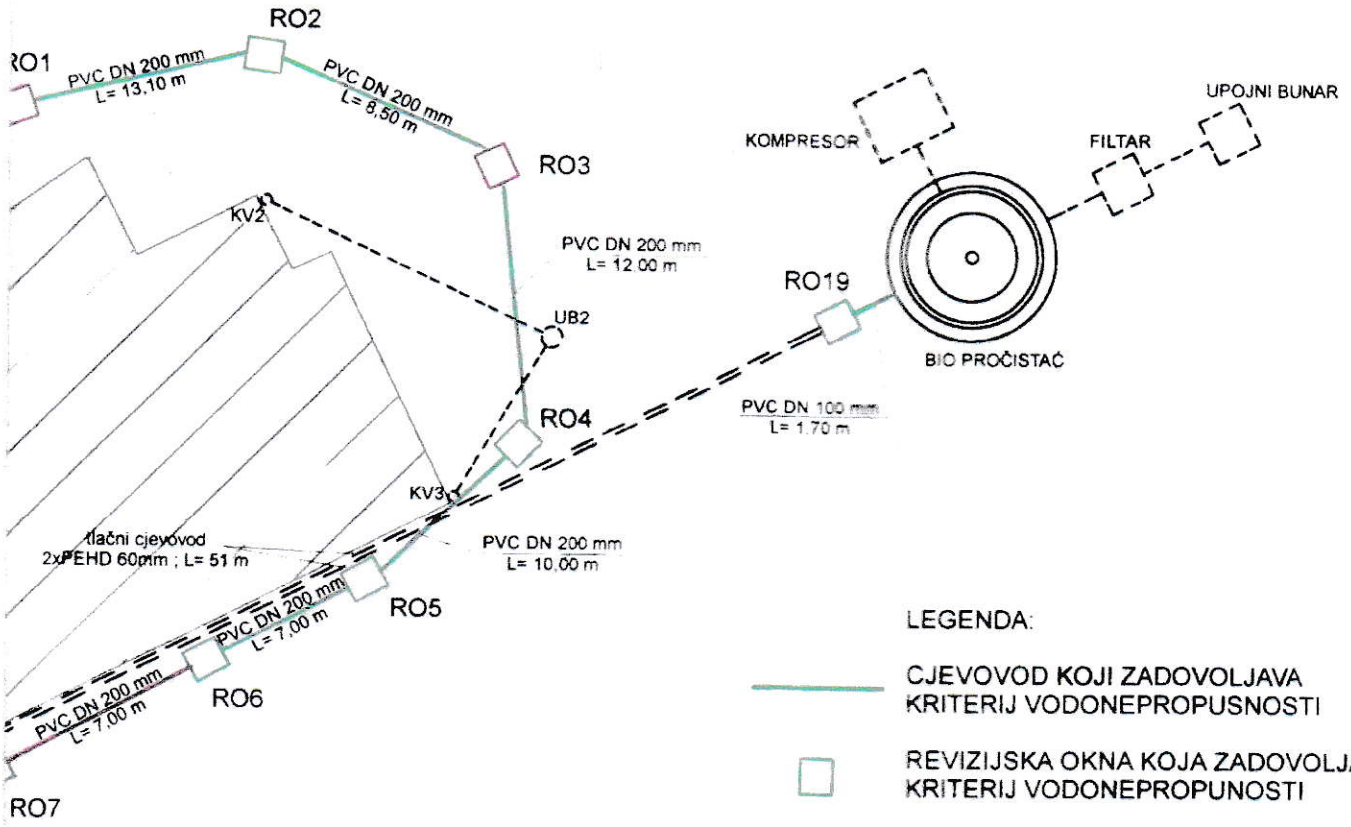

LEGENDA:

CJEVOVOD KOJI ZADOVOLJAVA KRITERIJ VODONEPROPUSNOSTI

REVIZIJSKA OKNA KOJA ZADOVOLJAVAJU KRITERIJ VODONEPROPUNOSTI

CJEVOVOD KOJI NE ZADOVOLJAVA KRITERIJ VODONEPROPUSNOSTI

REVIZIJSKA OKNA KOJA NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJ VODONEPROPUNOSTI
